neue bahnstadt opladen - Rahmenterminplan Gütergleisverlegung

(unter Berücksichtigung der Bauphasenplanung der DB Intarnational aus der Vorplanung vom 22.07.2011)

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1					
2	**Rahmenterminplan**	**1445 Tage**	**Fr 22.07.11**	**Do 02.02.17**	
3	**Vorlage Grundlagenermittlung und Vorplanung**	0 Tage	Fr 22.07.11	Fr 22.07.11	
4	**Vorstandssitzung DB Netz AG**	0 Tage	Do 17.11.11	Do 17.11.11	
5	**Sitzung Ressortvorstand Infrastruktur**	0 Tage	Mo 28.11.11	Mo 28.11.11	
6	**Sitzung der Holding der DB AG**	0 Tage	Di 06.12.11	Di 06.12.11	
7	**Entwurfsplanung**	**190 Tage**	**Mo 23.01.12**	**Fr 12.10.12**	
8	Entwurfsplanung	6,5 Monate	Mo 23.01.12	Fr 20.07.12	
9	Vorlage Planungsheft Enwurfsplanung durch DB AG	0 Tage	Fr 20.07.12	Fr 20.07.12	8
10	Vorstellung der Entwurfsplanung bei der Stadt Leverkusen	0 Tage	Fr 03.08.12	Fr 03.08.12	9EA+2 Woche
11	Endtermin für das Rücktrittsrecht der Stadt Leverkusen	0 Tage	Fr 12.10.12	Fr 12.10.12	8EA+3 Monate
12	**Genehmigungsplanung**	**68 Tage**	**Mo 23.07.12**	**Mi 24.10.12**	
13	Genehmigungsplanung	3,4 Monate	Mo 23.07.12	Mi 24.10.12	8
14	Vorlage Planungsheft Genehmigungsplanung durch DB AG	0 Tage	Mi 24.10.12	Mi 24.10.12	13
15	**Planrecht**	**396 Tage**	**Do 25.10.12**	**Do 01.05.14**	
16	Planfeststellungsverfahren	19,8 Monate	Do 25.10.12	Do 01.05.14	14
17	**Ausschreibung der Bauleistungen**	**80 Tage**	**Fr 04.04.14**	**Do 24.07.14**	
18	Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen	4 Monate	Fr 04.04.14	Do 24.07.14	13;16EA-1 Mor
19	**Ausführungsplanung**	**80 Tage**	**Fr 27.06.14**	**Do 16.10.14**	
20	Ausführungsplanung	4 Monate	Fr 27.06.14	Do 16.10.14	18EA-1 Monat
21	Vorlage Planungsheft Ausführungsplanung für Rückbau Hochbauten, P+R-Anlage, Oberflächenbefesti	0 Tage	Fr 19.09.14	Fr 19.09.14	26AA-1 Monat
22	Vorlage Gesamt-Planungsheft Ausführungsplanung durch DB AG	0 Tage	Do 16.10.14	Do 16.10.14	20
23	**Baurecht**	**40 Tage**	**Fr 19.09.14**	**Do 13.11.14**	
24	Baurecht	2 Monate	Fr 19.09.14	Do 13.11.14	20EA-1 Monat
25	**Beginn und zeitlicher Ablauf der Bauausführung, einschl. Ausführungsplanung**	**480 Tage**	**Fr 17.10.14**	**Do 18.08.16**	
26	Rückbau Hochbauten, P+R-Anlage, Oberflächenbefestigungen	3 Monate	Fr 17.10.14	Do 08.01.15	20;24EA-1 Mor
27	Leitungssicherungen/Verlegung EÜ Lützenkirchner Straße	1 Monat	Fr 12.12.14	Do 08.01.15	26EA-1 Monat
28	Neubau EÜ Lützkirchener Straße	7 Monate	Fr 09.01.15	Do 23.07.15	27
29	Neubau Stützwand km 47,79 bis 47,88 (Sicherung RÜ-Kanal)	5 Monate	Fr 03.04.15	Do 20.08.15	28EA-4 Monate
30	Auflösung Querfelder Oberleitung und Anpassung Nordkopf und Südkopf	12 Monate	Fr 09.01.15	Do 10.12.15	28AA
31	Neubau Gütergleise und Überholgleis von km 47,7 bis 49,4 (Gla. Bender ausgespart)	7 Monate	Fr 24.07.15	Do 04.02.16	30EA-5 Monate
32	Herstellung OLA, 50 Hz, TK, LST km 47,7 bis 50,0	8 Monate	Fr 16.10.15	Do 26.05.16	31EA-4 Monate
33	Lückenschlüsse Strecke 2324 Nordkopf und Südkopf sowie Durchbindung Gla Bender	1 Monat	Fr 27.05.16	Do 23.06.16	32
34	Anschluss Gla. Bender, Fw-Zufahrt-ESTW Modul	1 Monat	Fr 24.06.16	Do 21.07.16	33
35	Rückbau EÜ Bahnhofstraße, EÜ Lützkirchner Straße	1 Monat	Fr 24.06.16	Do 21.07.16	33
36	Rückbau Gleise und Weichen	1 Monat	Fr 22.07.16	Do 18.08.16	35
37	**Zeitpunkt der Inbetriebnahme**	**0 Tage**	**Do 18.08.16**	**Do 18.08.16**	**25**
38	**Puffer für den IBN bis zum Fahrplanwechsel**	**4 Monate**	**Mi 24.08.16**	**Mi 14.12.16**	**39EE;37**
39	**Fahrplanwechsel**	**0 Tage**	**Mi 14.12.16**	**Mi 14.12.16**	
40	**Kaufmännischer Abschluss**	**7 Monate**	**Fr 24.06.16**	**Do 05.01.17**	**33**
41	**Schluss-WR**	**1 Monat**	**Fr 06.01.17**	**Do 02.02.17**	**40**
42	**Projektabschluss**	**0 Tage**	**Do 02.02.17**	**Do 02.02.17**	**41**

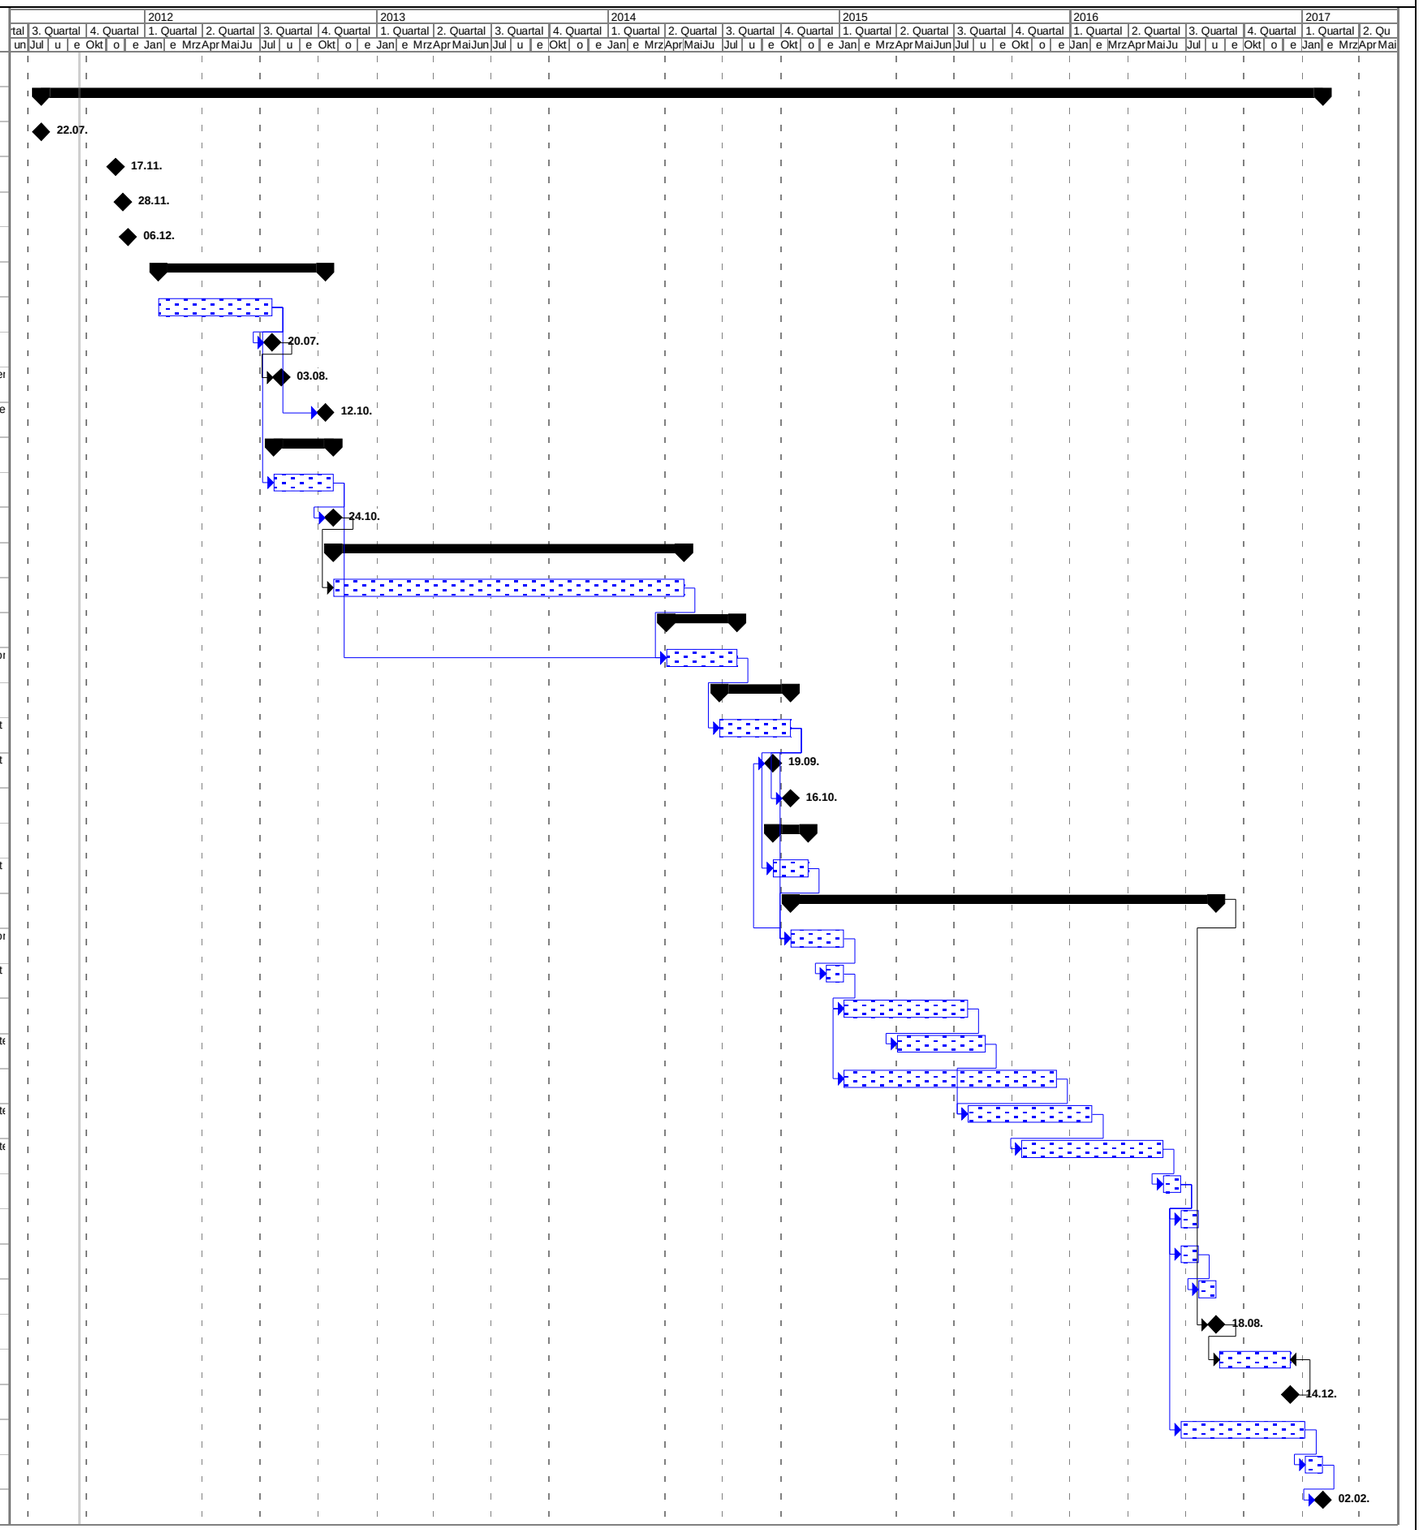

Projekt: nbso-06_WS-2011_09_19_für
Datum: Mo 19.09.11

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein
