Terminübersicht KGS Burgweg Variante II "Neubau"

Nr.	Vorgangsname	Dauer
1	Beschluß der Variante II	0 Tage
2	Vertragsanpassung Planungsteam	2 Monate
3	LPH 1 Grundlagen	4 Monate
4	LPH 2 Vorentwurf	5 Monate
5	LPH 3 Entwurf	6 Monate
6	Vorlage Planungs- und Baubeschluss	1,5 Monate
7	Baubeschluss	0 Tage
8	Weiterbeauftragung Planungsteam	2 Monate
9	LPH 5 Ausführungsplanung	11 Monate
10	LPH 6 + 7 Ausschreibung + Vergabe	11 Monate
11	Baubeginn	0 Tage
12	Ausführung	25 Monate
13	Mängelbeseitigung Dokumentation	3 Monate
14	Fertigstellung	0 Tage

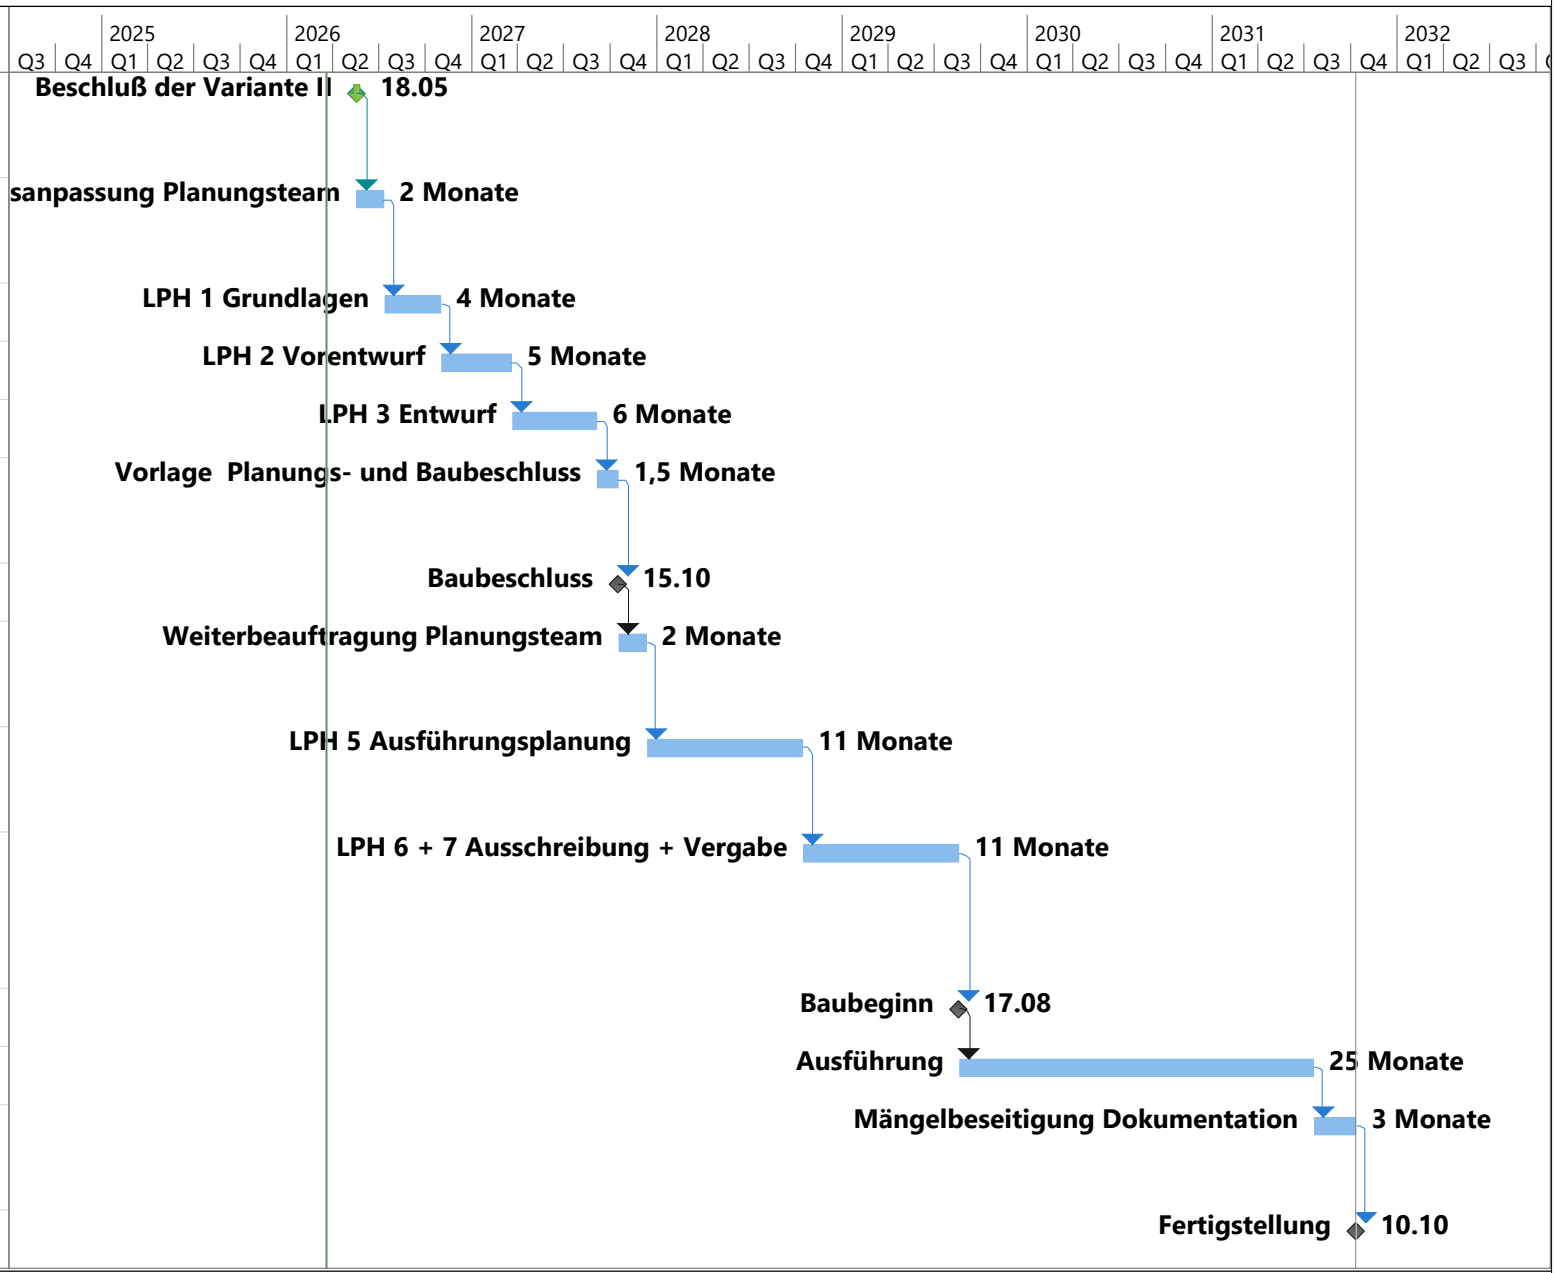

Fre 20.03.26
